


1. 工事概要

- 1) 工 事 名 称 : 服部緑地複合型温浴施設新築工事に伴う
温泉動力装置設置工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府豊中市服部緑地園内 掘削地点
- 3) 施 主 : 株式会社ビーバーレコード
- 4) 設 計 : 株式会社プレイス総合計画
- 5) 監 理 : 株式会社プレイス総合計画
- 6) 施 工 : 株式会社旭工建
- 7) 工 事 期 間 : 令和7年8月25日～令和8年2月28日
- 8) 工 事 内 容
 - ① 仮設資材、動力装置等搬入（搬入車輛・6tユニック車輛及び3tユニット車輛）
 - ② 仮設工 3tクレーンにて作業床・敷鉄板養生（W1200×D2400×4枚）
仮囲い一時撤去
 - ③ 6t車輛にて準備工 動力装置材料検収（行政立ち合い）
 - ④ 動力装置据付
 - ⑤ 仮囲い復旧
 - ⑥ 3tクレーンにて作業床・敷鉄板養生（W1200×D2400×4枚）撤去
 - ⑦ 報告作成
 - ⑧ 動力装置設置完了届出提出
- 9) 施 工 業 者 : 株式会社 山西サク井設備
大阪府東大阪市中新開1丁目5-25
TEL : 072-962-4848 FAX : 072-961-4818


工事計画場所

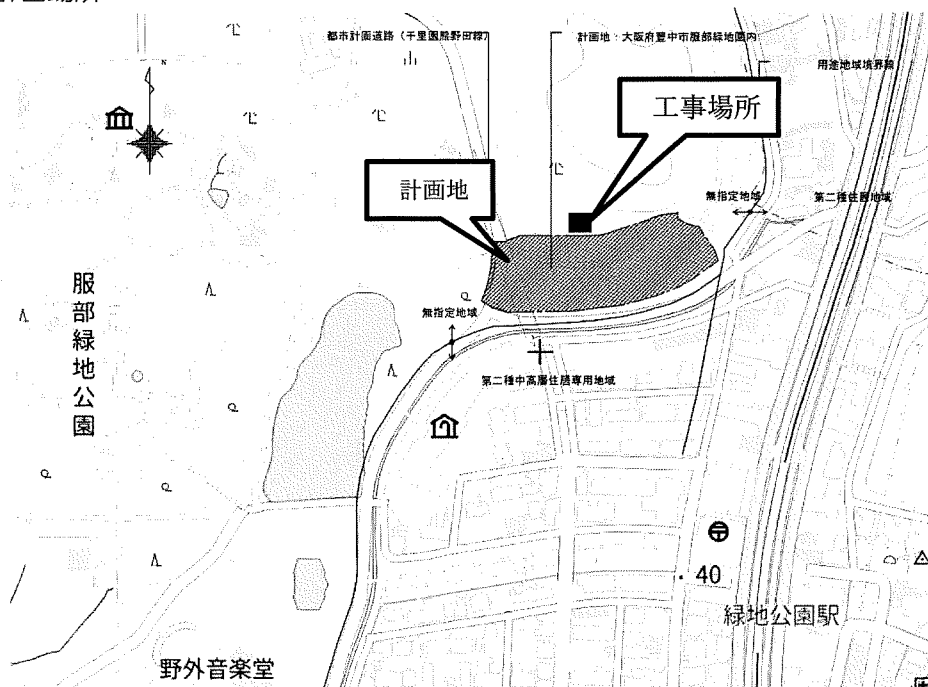

動力装置設置工事

作業範囲、散策路幅確保寸法概要図

- ※ 作業床・敷鉄板：1200×2400×4枚予定
- ※ 通行可能幅：2.68m
- ※ 警備員配置：1名
- ※ 安全バリケード：A型バリケード
- ※ チューブライト

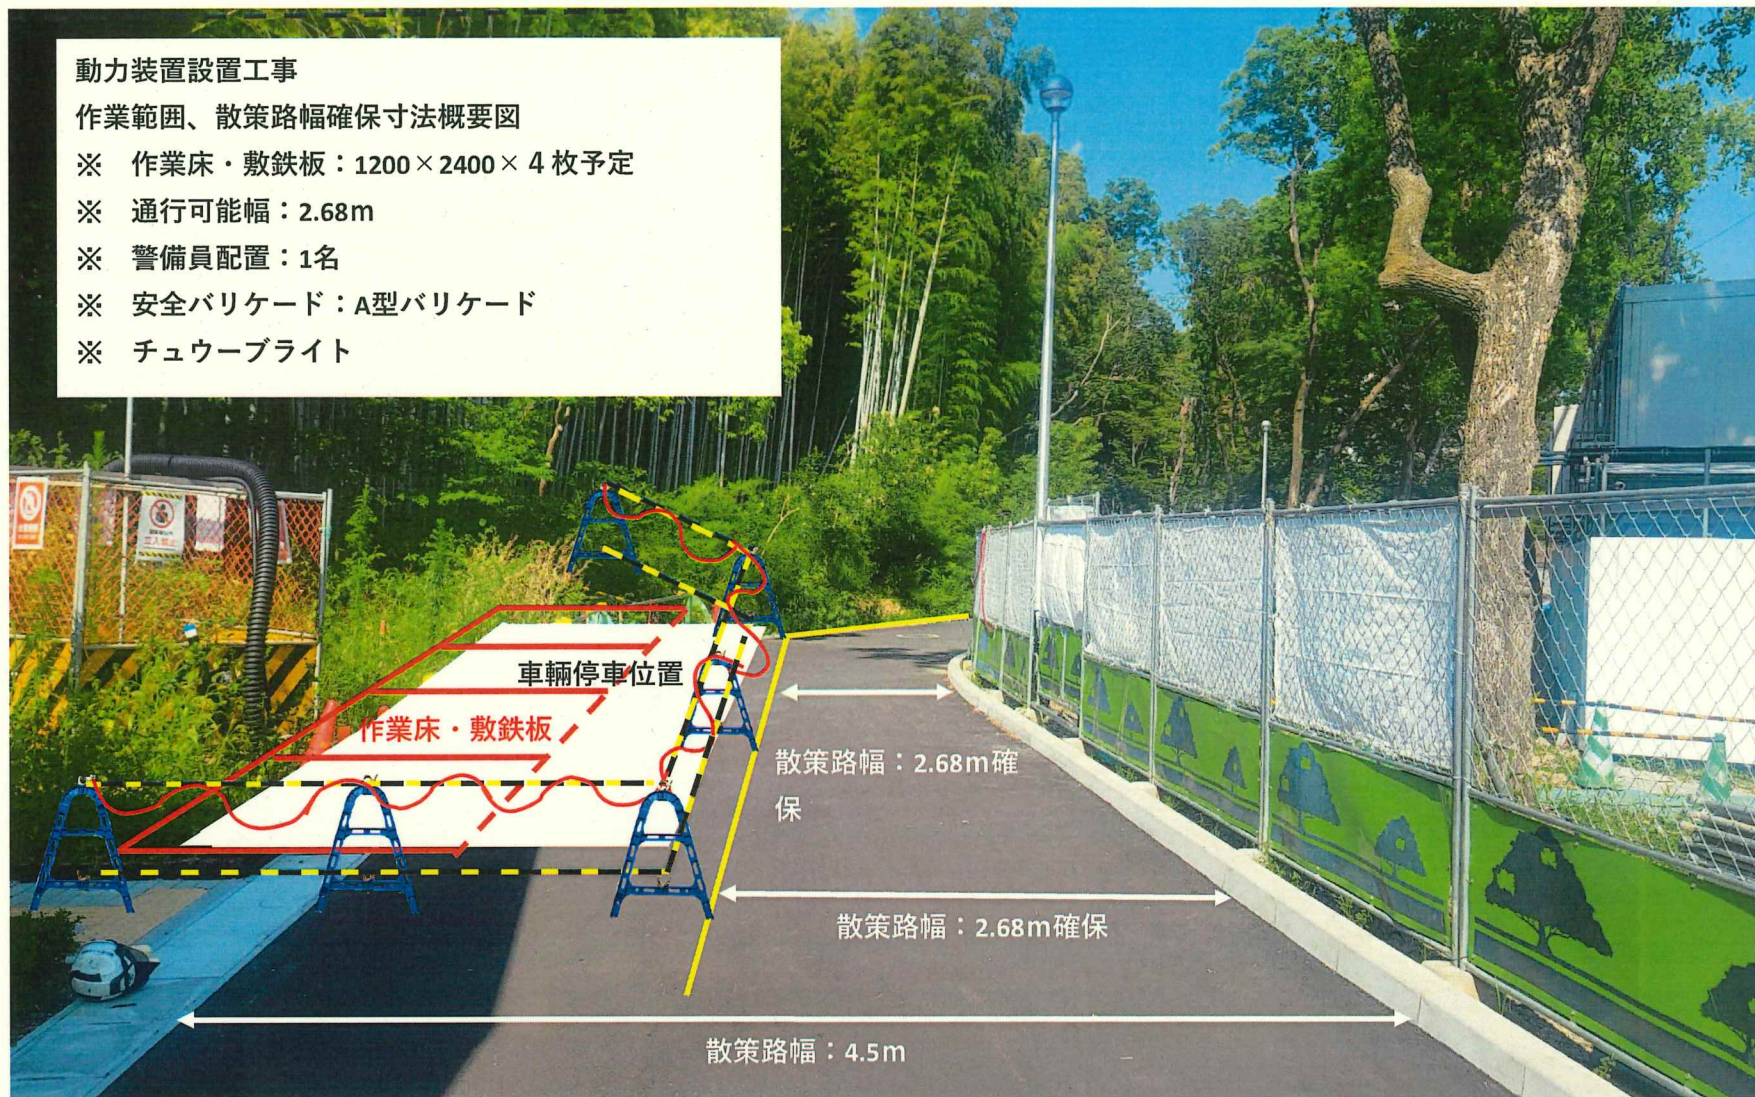

進入路及び車輛停車概要図

搬入車輛

左折入場

左折退場



作業範圍面積最大：96㎡

旋回範圍

8m

12m

進入時誘導員配置

散策路:2.65m確保

搬入車輛旋回、一時停車スペース

進入時誘導員配置

